

Date d'intervention	26/02/2026	Client	CARREFOUR SYSTEMES D INFORMATION
Type d'intervention	Mise à disposition	Site	FR-CS00891_7499_MACON - LACRETELLE
Technicien(s)	BENMAYOUF Badredinne	Adresse	18 Rue LACRETELLE MACON (71000)
Contact		Coordonnées	
Description	Prévoir du LMR400 Voir audit en PJ pour cheminement et emplacement d'antenne 5 étapes à respecter pour compléter l'intervention : 1 - Installation d'antenne : Installation d'une antenne passive sur le 4G, côté fenêtre. Interdiction de la placer en faux plafond ou porte coupe-feu (non conforme). Ne pas installer l'antenne en sous-sol. Aucun câble ne doit être apparent ou accessible. Prendre une photo de l'antenne. 2 - Prendre les valeurs radios sur SFR et les indiquer sur le PV (après installation d'antenne). 3 - Prendre les valeurs radios sur Orange et les indiquer sur le PV (après installation d'antenne). ETAPE 2 et 3 OBLIGATOIRE SINON PV NON CONFORME. 4 - Faire une MAD 4G (avec le meilleur HNO) : A/Contexte Fibre livrée : non Livraison d'un routeur 4G. Matériel sur site B/Infos technique : 4G : Port 0 et 1 DHCP : OUI Adresse du routeur : 192.168.30.6/29 Le routeur 4G doit avoir en DNS 8.8.8.8 et 8.8.4.4 ou 8.8.8.8 et 1.1.1.1 C/Instructions : Installer les routeurs dans la baie. Si impossible, reprendre le routeur et l'indiquer en commentaire. Brancher l'ONT/RAD sur le port gi 0/0/0 (si absent, laisser un câble branché sur le port) Ne pas oublier les câbles étiquetés svp // Se référer à Norme_de_Cablage_Carrefour.png en PJ PRAXEDO Effectuer un test de débit Appeler la MER (0279373839) AVANT de quitter le site pour valider le CRI 5 - IMPORTANT : il faut photo de l'antenne + test de débit et valeurs radio sur les 2 HNO sinon le PV N'EST PAS CONFORME !		

Compte-rendu d'activités

Rapport d'intervention

Date	Début	Fin	Activité	Durée
25/02/2026	16:24	09:04	En intervention	16:39
Total				16:39

RDS	QK-8263-TA
Équipements à récupérer	non
Coordinateur client	Delphine Olmo
Coordonnées du coordinateur client	delphine.olmo@linkt.fr / 0279370068
Rendez-vous prestataire client/OBL ?	NON
Migration à prévoir ?	NON
Client présent	OUI

Photo(s) avant intervention

Ligne 01	
Photo	 46.30493;4.82879 fc.g=1 fc.o=1 fc.s=1 fc.r=1280x1024 fc.a=1
Ligne 02	
Photo	 46.30493;4.82879 fc.a=1 fc.r=1280x1024 fc.s=1 fc.o=1 fc.g=1

Rapport d'intervention

Ligne 03

Photo



46.30498;4.82881

fc.s=1

fc.o=1

fc.g=1

Nombre de lien(s) fixe(s)

0

Nombre d'accès(s) mobile(s)

1

Accès mobile 1

Référence de Service (RDS)

QK-8263-TA

Type d'offre

Internet 4G Air Entreprise - 20 Go mutualise - CA

L'installation de l'accès mobile
est-elle un succès ?

SUCCES

Photo de l'équipement installé



Scan du numéro de série
impossible ?




Numéro de série du CPE 1

S2513ux000898

Rapport d'intervention

Test de débit

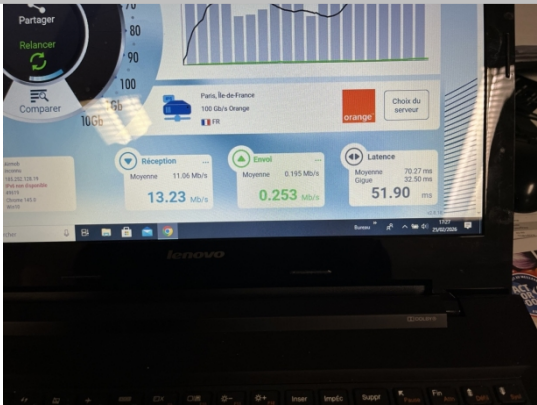

Valeur RSRP remontée par le routeur	-108
Valeur SNR remontée par le routeur	1
Des antennes déportées ont-elles été installées ?	Oui, des antennes cierges.
La migration sur l'accès mobile a t-elle été effectuée ?	NON, elle n'a pas été réalisée.

Photo(s) après intervention

Ligne 01

Photo



46.30007;4.82393
fc.g=1
fc.a=1
fc.r=1280x1024
fc.o=1

Ligne 02

Photo



46.29986;4.82374

Siège social Linkt - 1B Place de la Défense - Tour Trinity, 92400 Courbevoie, France

SAS au capital de 77 000 000 € - TVA sur les encaissements

Numéro de SIRET : 81510946700150 - TVA intracommunautaire FR 26815109467 - Numéro immatriculation : 815 109 467 Nanterre B

Rapport d'intervention

Ligne 03	
Photo	 46.29956;4.82347 fc.o=1 fc.a=1 fc.g=1

Du matériel a t-il été décommissionné ?	NON
Un Geste de proximité a t-il été effectué sur le site durant la Mise en service ?	OUI

Geste de proximité additionnel	
Photos des travaux aditionnels effectués	
row	
Photo des travaux	 46.30495;4.82879 fc.r=1024x768
row	

Rapport d'intervention

row	
Photo des travaux	 46.30495;4.82877 fc.g=2 fc.r=1024x768
row	
Photo des travaux	 46.30494;4.82876 fc.o=1
row	
Photo des travaux	 46.30492;4.82883 fc.r=1024x768 fc.g=2 fc.o=1
row	

Rapport d'intervention

Photo des travaux	 46.30491;4.82878 fc.s=1
row	
Photo des travaux	 46.30494;4.82876 fc.s=1 fc.g=2 fc.r=1024x768
Commentaire du technicien :	RDV OK, installation et mise en service du routeur 4G. Installation d'une antenne cierge posé en intérieur dans la réserve du magasin, car installation en extérieur impossible il faut prévoir 80 mètres de câble coaxial de la baie jusqu'à la façade extérieure. Pose de 25 mètres de câble coaxial entre routeur et antenne. Speed test sur 4G avant/après travaux OK et relevés des valeurs radio auprès de la MER sur les deux HNO OK. -Valeur radio SFR avec antenne cierge : RSRP -103/ SNR -2 -Valeur radio Orange avec antenne cierge : RSRP -108 / SNR 1 Routeur laissée sur réseau Orange en fin d'intervention. Malgré les travaux résultats sont mauvais et pas aux attentes. En attente arbitrage CRF.
Résultat de l'intervention	Succès
Nom du signataire	MR Zaanfardine
Fonction du signataire	Responsable magasin
Signature client	
Signature technicien	
