

Bon d'intervention WOI-NKESG-1

Code client	C-HCBBV
Référence site client	fr-cs03213_a50m
Adresse	Carrefour Proximité 42 Cours Du Commerce, Châtenay-Malabry, 92290, FR
Début d'intervention	13 août 2026 14:04
Clôture de l'intervention	13 août 2026 14:08
Nom du contact sur place	Responsable
Nom du technicien	Jose / Sadibou
Commentaires du technicien	Install et tests ok
Résultat de l'intervention	Réussie

Validation client

13 août 2026 14:07	En attente
--------------------	------------

/!\ INFORMATION INTERVENTION /!\

Vous intervenez dans le cadre de l'installation d'une antenne 4G déportée pour un Carrefour.

L'objectif de cette intervention est d'installé le kit puis de refaire un test de débit sur le routeur

Attention: il faudra laisser toutes les antennes sauf celle sur le port : MAIN à démonter pour y raccorder notre antenne déportée

Mise en service du routeur 4G dans la baie

Installer le routeur 4G dans la baie et le brancher sur une prise électrique ondulée
Il faudra aussi qu'à la fin de votre installation, le service soit en niveaux Excellent ou Bien comme évoqué ci-dessous

RSRP (niveau de signal)	SNR > 15 dB (Excellent)	SNR 5–15 dB (Bon)	SNR 0–5 dB (Moyen)	SNR < 0 dB (Faible)
> -85 dBm	Performance optimale Débits maximaux Latence minimale Latence minimale et excellente stabilité.	Très bonne Débits élevés Stable Latence minimale et excellente stabilité.	Correcte Débits moyens Quelques variations Latence minimale et excellente stabilité.	Dégradée Débits faibles Instabilité Latence minimale et excellente stabilité.
-85 à -100 dBm	Très bonne Débits élevés Très stable Latence faible et connexion généralement stable.	Bonne Débits corrects Généralement stable Latence faible et connexion généralement stable.	Acceptable Débits variables Sensible aux perturbations Latence faible et connexion généralement stable.	Problématique Connexion instable Coupures possibles Latence faible et connexion généralement stable.
-100 à -115 dBm	Bonne Débits corrects Connexion fiable Latence moyenne, stabilité sensible à la charge réseau.	Acceptable Débits moyens Quelques ralentissements Latence moyenne, stabilité sensible à la charge réseau.	Limite Débits faibles Sensible à la charge Latence moyenne, stabilité sensible à la charge réseau.	Très dégradée Connexion difficile Coupures fréquentes Latence moyenne, stabilité sensible à la charge réseau.
< -115 dBm	Utilisable Débits réduits Mais stables Latence élevée, instabilité fréquente voire perte de service.	Limite Service minimal Forte variabilité Latence élevée, instabilité fréquente voire perte de service.	Critique Connexion intermittente Usage difficile Latence élevée, instabilité fréquente voire perte de service.	Inutilisable Pas de service stable Latence élevée, instabilité fréquente voire perte de service.

-
- ✔ Installer l'antenne déportée à l'endroit où c'est demandé dans le rapport de prévisite
-

- ✔ prendre des photo du cheminement d'où se trouve l'antenne à la baie où se trouve le routeur 4G

Pouvez vous intégrer les photos des travaux réalisés du 4G vers l'antenne avec le cheminement complet svp



-
- ✔ Dévisser antenne sur le routeur 4G où nous avons l'écriture "MAIN" et brancher notre antenne déportée

Attention: il faudra sur le port MAIN, retirer la petite antenne et y raccorder l'antenne déportée


-
- ✔ METTRE VOTRE PC EN IP DHCP ET LE CONNECTER SUR LE PORT GEO

-
- ⓘ TEST AVEC L'OPERATEUR BOUYGUES
-



OPERATEUR BOUYGUES Test du débit sur le Routeur sur : <https://www.nperf.com/en/>

faire un speedtest sur le routeur afin de valider que le débit et le signal sont bons

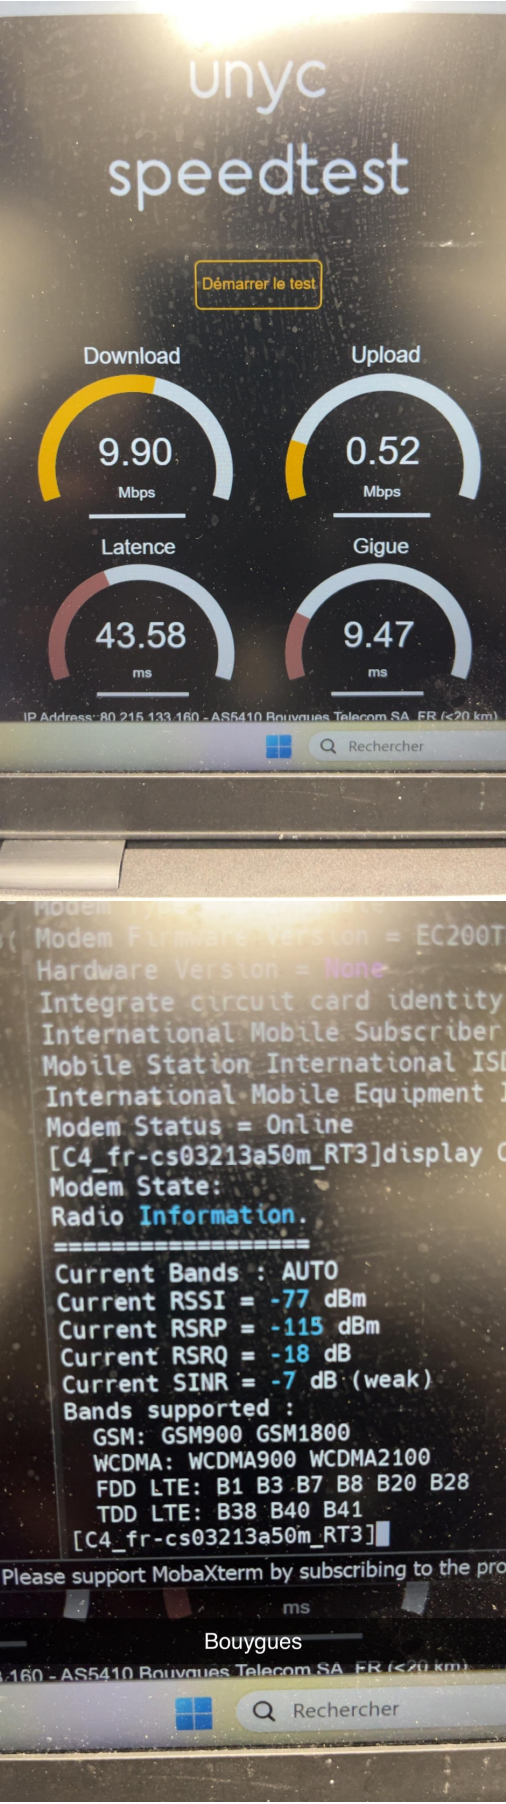

APPELER LE SUPPORT ADISTA AU 0134344387 ET NOTER LES VALEURS CI-DESSOUS

SNR:

RSRP:

✔ SUITE A LA VALEUR RSRP REMONTEE PAR LE SUPPORT COMMENT QUALIFIERIEZ-VOUS LE SIGNAL ?

RSRP (niveau de signal)	SNR > 15 dB (Excellent)	SNR 5–15 dB (Bon)	SNR 0–5 dB (Moyen)	SNR < 0 dB (Faible)
> -85 dBm	Performance optimale Débits maximaux Latence minimale Latence minimale et excellente stabilité.	Très bonne Débits élevés Stable Latence minimale et excellente stabilité.	Correcte Débits moyens Quelques variations Latence minimale et excellente stabilité.	Dégradée Débits faibles Instabilité Latence minimale et excellente stabilité.
-85 à -100 dBm	Très bonne Débits élevés Très stable Latence faible et connexion généralement stable.	Bonne Débits corrects Généralement stable Latence faible et connexion généralement stable.	Acceptable Débits variables Sensible aux perturbations Latence faible et connexion généralement stable.	Problématique Connexion instable Coupures possibles Latence faible et connexion généralement stable.
-100 à -115 dBm	Bonne Débits corrects Connexion fiable Latence moyenne, stabilité sensible à la charge réseau.	Acceptable Débits moyens Quelques ralentissements Latence moyenne, stabilité sensible à la charge réseau.	Limite Débits faibles Sensible à la charge Latence moyenne, stabilité sensible à la charge réseau.	Très dégradée Connexion difficile Coupures fréquentes Latence moyenne, stabilité sensible à la charge réseau.
< -115 dBm	Utilisable Débits réduits Mais stables Latence élevée, instabilité fréquente voire perte de service.	Limite Service minimal Forte variabilité Latence élevée, instabilité fréquente voire perte de service.	Critique Connexion intermittente Usage difficile Latence élevée, instabilité fréquente voire perte de service.	Inutilisable Pas de service stable Latence élevée, instabilité fréquente voire perte de service.

MAUVAIS


ℹ SI LE SIGNAL EST MOYEN OU MAUVAIS TESTEZ AVEC L'OPERATEUR ORANGE - SI LE SIGNAL BOUYGUES EST OK - A NE PAS REALISER

Appeler le support Waycom au 0134344387 afin de passer le routeur sur la sim Orange.



OPERATEUR ORANGE Test du débit sur le Routeur sur : <https://www.nperf.com/en/>

faire un speedtest sur le routeur afin de valider que le débit et le signal sont bons

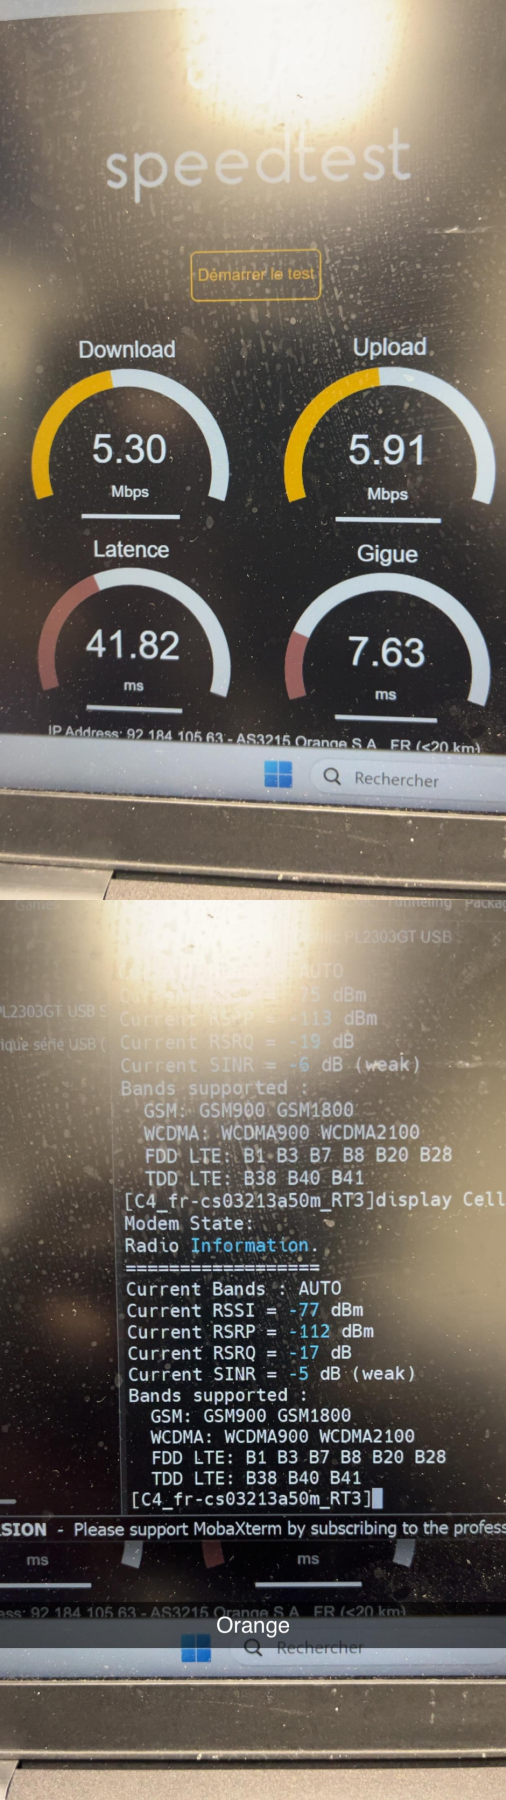

APPELER LE SUPPORT ADISTA AU 0134344387 ET NOTER LES VALEURS CI-DESSOUS

SNR:

RSRP:

✔ SUITE A LA VALEUR RSRP REMONTEE PAR LE SUPPORT COMMENT QUALIFIERIEZ-VOUS LE SIGNAL ?

RSRP (niveau de signal)	SNR > 15 dB (Excellent)	SNR 5–15 dB (Bon)	SNR 0–5 dB (Moyen)	SNR < 0 dB (Faible)
> -85 dBm	● Performance optimale Débits maximaux Latence minimale Latence minimale et excellente stabilité.	● Très bonne Débits élevés Stable Latence minimale et excellente stabilité.	● Correcte Débits moyens Quelques variations Latence minimale et excellente stabilité.	● Dégradée Débits faibles Instabilité Latence minimale et excellente stabilité.
-85 à -100 dBm	● Très bonne Débits élevés Très stable Latence faible et connexion généralement stable.	● Bonne Débits corrects Généralement stable Latence faible et connexion généralement stable.	● Acceptable Débits variables Sensible aux perturbations Latence faible et connexion généralement stable.	● Problématique Connexion instable Coupures possibles Latence faible et connexion généralement stable.
-100 à -115 dBm	● Bonne Débits corrects Connexion fiable Latence moyenne, stabilité sensible à la charge réseau.	● Acceptable Débits moyens Quelques ralentissements Latence moyenne, stabilité sensible à la charge réseau.	▲ Limite Débits faibles Sensible à la charge Latence moyenne, stabilité sensible à la charge réseau.	● Très dégradée Connexion difficile Coupures fréquentes Latence moyenne, stabilité sensible à la charge réseau.
< -115 dBm	▲ Utilisable Débits réduits Mais stables Latence élevée, instabilité fréquente voire perte de service.	▲ Limite Service minimal Forte variabilité Latence élevée, instabilité fréquente voire perte de service.	● Critique Connexion intermittente Usage difficile Latence élevée, instabilité fréquente voire perte de service.	● Inutilisable Pas de service stable Latence élevée, instabilité fréquente voire perte de service.

MAUVAIS

✔ APRES VOS TESTS REMETTRE LE MEILLEUR OPERATEUR

Il faudra mettre le meilleur opérateur en fonction de vos tests avec le support Adista 0134344387

✔ QUEL OPERATEUR A FINALEMENT ETE ACTIVE ?

ORANGE

✔ PRENDRE LE CABLE RJ 45 BLEU DANS LE COLIS


✔ PRENDRE LE PREMIER COTE DU CABLE ETIQUETE: C4-RT3-GE0 vers SD1 port WAN2 ET LE BRANCHER SUR LE PORT GE0 DU ROUTEUR 4G ADISTA

-
- ✓ PRENDRE UNE PHOTO DU CABLE ETIQUETE ET BRANCHE AU DOS DU ROUTEUR




-
- ✓ LAISSER L'AUTRE COTE DU CABLE EN VOLANT

-
- ✓ PRENDRE UNE PHOTO DU CABLE LAISSE EN VOLANT

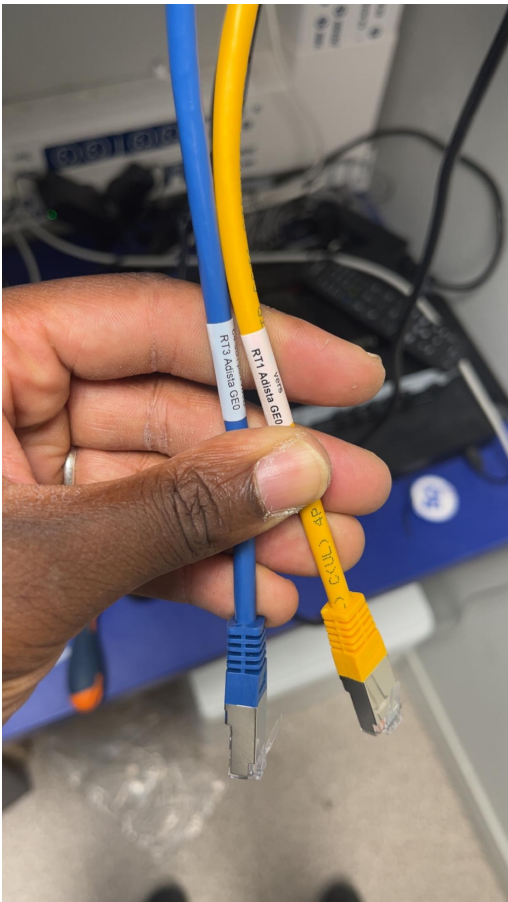

-
- ✓ PRENDRE UNE PHOTO DU ROUTEUR 4G EN BAIE AVEC DU REcul

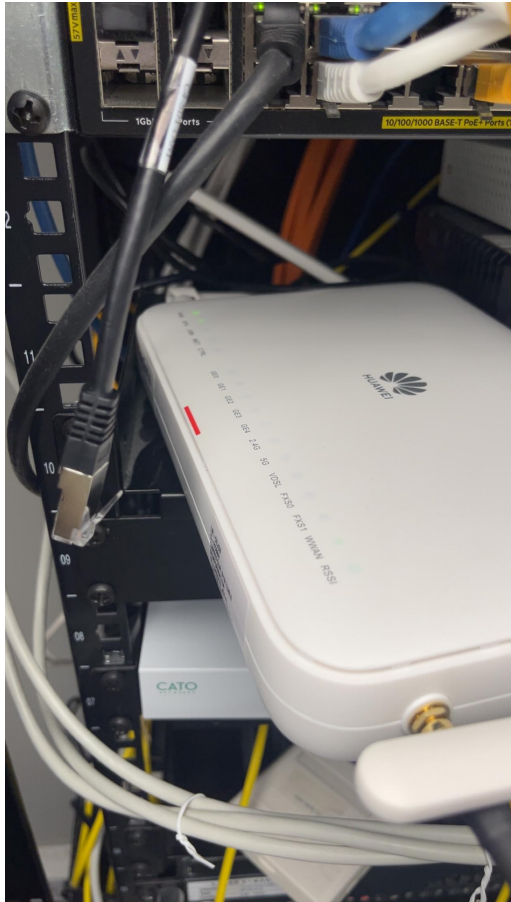

-
- ✓ APPELER IMPERATIVEMENT LE DIRECTEUR DE PROJET SONNY BELLASSEN AU 0623842849 AFIN DE VALIDER LE RAPPORT
